


FACT-SHEET Neubau SH Zentrum, Diessenhofen


Grobe Termininformation:

14.08.2023 - 13.10.2023	Installation+Montage Schulraumprovisorium
16.10.2023 - 20.10.2023	Zügeln der Schulklassen ins Containerdorf
23.10.2023 - 17.11.2023	Schadstoffsanierung in altem Schulhaus
20.11.2023 - Januar 2024	Rückbau und Abbruch altes Schulhaus
Februar 2024	Erdsondenbohrungen
März 2024 - Juni 2025	Erstellung neuen Schulhaus

Bauplatzinstallation für Montage Schulraumprovisorium ab 14.8.2023 - 20.10.2023

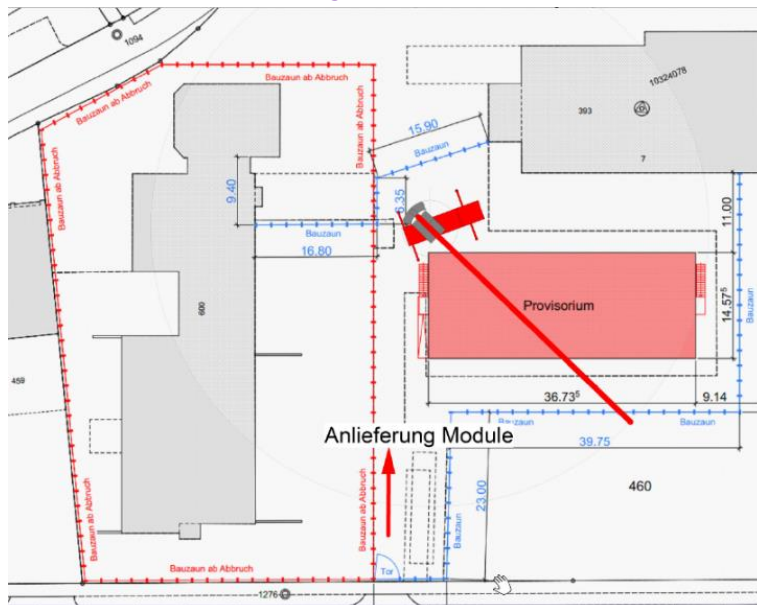

Ansicht Containerdorf

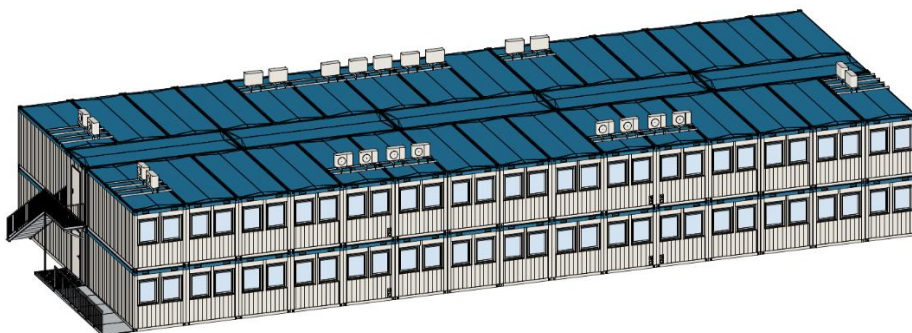

- 70 Container in 35 Lastwagen-Transporten mit Anhänger
- etwa alle 60 Minuten eine An- und Wegfahrt
- Zeitfenster: 28.8.2023 bis 08.09.2023

Bauplatzinstallation für den Abbruch und den Neubau ab 23.10.2023 - 30.6.2025



Ihre Ansprechpartner auf der Baustelle der Bauleitung:
Hoch3 Baumanagement AG, Stein am Rhein



Justine Gonzalez, Bauleiterin



Beat Müller, Projektleiter

T 052 742 07 50
www.hoch3bau.ch

Archplatz 2
8400 Winterthur

Bahnhofstrasse 11
8260 Stein am Rhein

Hoch3
Baumanagement AG
